Trazabilidad para cada caso PQRSF

Propuesta de arquitectura para el Centro de Contacto — Universidad de La Sabana

Equipo Innova2: Nicolás Muñoz · Juan David Orozco | Cliente: Johanna Andrea Molina | Comité de Arquitectura, 14/11/2026

Cuatro actos, diez minutos

1

Problema

Se pierde la trazabilidad de cada caso

Talleres 1-2

2

Análisis

Dónde y por qué la arquitectura falla

Talleres 3-6

3

Solución

Qué proponemos y por qué esta opción

Talleres 7-8

4

Plan

Cómo llegar en 4 fases y quién gobierna

Taller 9

Cada acto muestra solo la evidencia esencial; el detalle completo está en el repositorio del equipo (carpetas 00 a 09).

Cada caso se cierra sin dejar rastro

Radicación multicanal
correo, WhatsApp, llamada, web/app

→

Registro en Anexo Unisabana
no exporta todos los campos

→

Transcripción manual al Excel
el Excel es la fuente real

→

Cierre en Excel
punto crítico: sin quién ni cuándo

Proceso actual (BPMN, Taller 1)

0%

de los cambios de estado quedan registrados con autor y fecha

1

persona registra, clasifica y enruta todos los casos

80%

meta institucional de oportunidad, sin alertas que avisen antes del vencimiento

La misma debilidad, vista desde tres ángulos

1 instancia

Infraestructura · Taller 4

El Servidor Anexo Unisabana corre en una sola instancia on-premise, sin redundancia ni plan de recuperación.

T2·T3·T4

Seguridad · Taller 5 (STRIDE)

El Excel compartido permite cambios sin rastro (Tampering, Repudiation) y expone datos personales a quien tenga acceso (Information Disclosure).

4 / 12 ítems

Normatividad · Taller 6

Solo 4 de 12 controles cumplen totalmente; no hay procedimiento ARCO documentado (Ley 1581, Decreto 1377).


Nueve riesgos, siete dominios, dos críticos

ID	Riesgo	Dominio	Nivel	Estrategia
R2	Doble registro manual (Anexo + Excel)	Procesos	**9**	Reducir
R3	Sin trazabilidad de cambios en el Excel	Datos	**9**	Reducir
R1	Una sola persona gestiona todos los casos	Negocio	**6**	Reducir
R4	Anexo Unisabana y Excel no integrados	Aplicaciones	**6**	Reducir
R5	Servidor Anexo Unisabana sin BCP/DRP	Infraestructura	**6**	Reducir
R6	Datos personales sin permisos por rol	Seguridad	**6**	Reducir
R7	Cumplimiento normativo parcial (sin ARCO)	Gobierno TI	**6**	Reducir
R8	Transferencia internacional vía WhatsApp	Datos / Gob. TI	**2**	Reducir
R9	Caída de la central telefónica (PBX)	Infraestructura	**2**	**Aceptar**

Nivel = impacto × probabilidad (1-12). Crítico desde 8.

R9 se acepta de forma explícita: el solicitante tiene otros cuatro canales para radicar y la PBX la administra la universidad. Se registra cada caída y se revisa cada semestre.

SharePoint: la opción que sí da trazabilidad

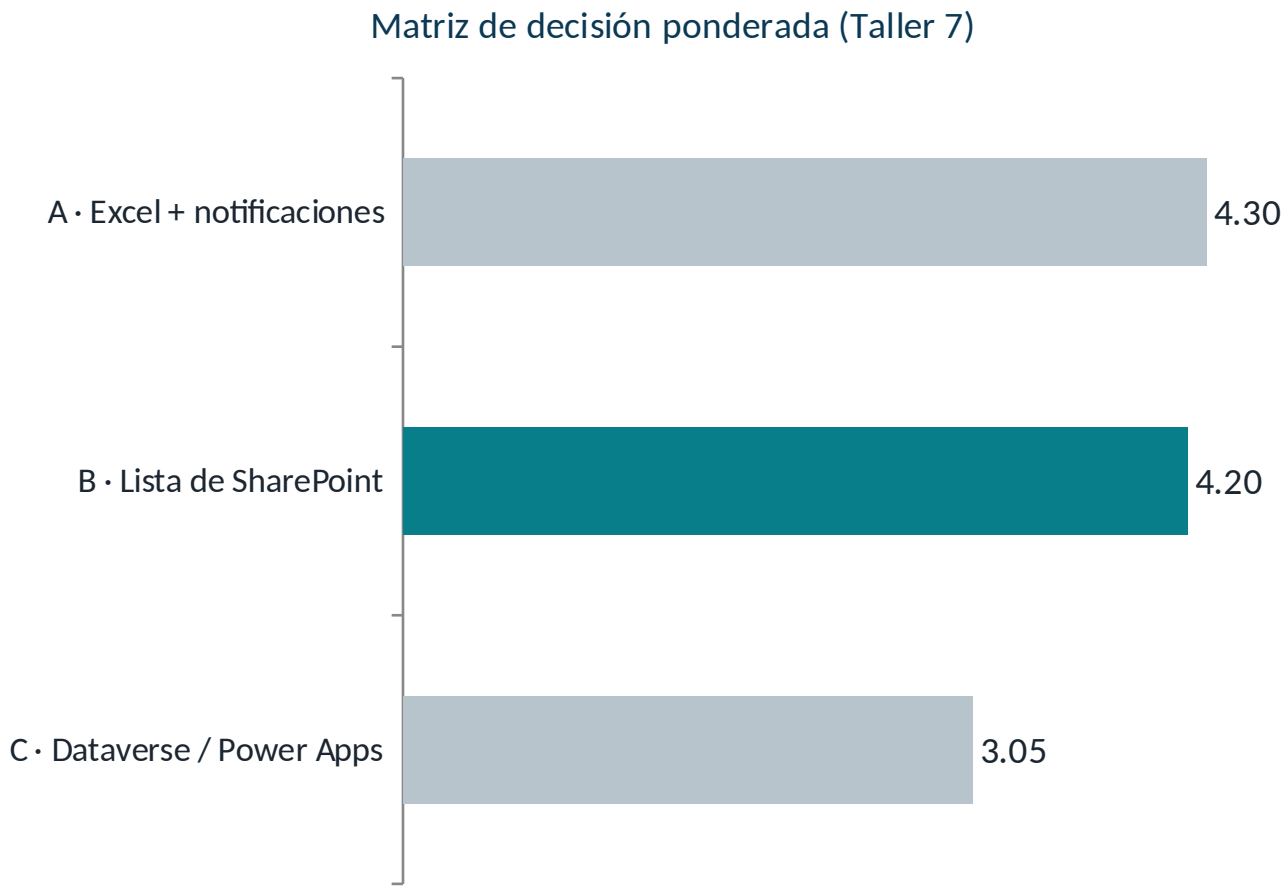

Criterios: Trazabilidad 35% · Costo 25% · Complejidad 20% · Tiempo 20%

A tiene el puntaje más alto, pero queda eliminada: Excel no da un historial confiable (Trazabilidad < 4, criterio eliminatorio).

B gana: historial nativo y permisos por rol, dentro de Microsoft 365, con menor curva que C.

De lo manual a lo trazable, dentro de M365

ACTO 3

HOY (AS-IS)		PROPUESTO (TO-BE)
Excel compartido editado a mano	→	Lista de SharePoint con historial y permisos por rol
Cierre sin autor ni fecha	→	Power Automate registra quién, cuándo y qué cambió
Vencimientos descubiertos tarde	→	Alertas de SLA por Teams/correo antes de vencer
Servidor sin plan de recuperación	→	Plan de Continuidad (BCP/DRP) probado
Sin ARCO ni evaluación de WhatsApp	→	ARCO, evaluación de WhatsApp y retención

Anexo Unisabana se conserva: reemplazarlo quedó fuera del alcance acordado con el cliente (Taller 0).

Cuatro fases en seis meses, de lo fácil a lo grande

Quick win

Nov - Dic 2026

ARCO, evaluación de WhatsApp y respaldo del rol

Corrige: R7 · R8 · R1
Esfuerzo bajo

Corto plazo

Dic 2026 - Ene 2027

Plan de Continuidad (BCP/DRP) del servidor

Corrige: R5
Esfuerzo medio

Mediano plazo

Ene - Mar 2027

Piloto Lista de SharePoint + permisos + Purview

Corrige: R3 · R6 · R4
Esfuerzo alto

Largo plazo

Abr - May 2027

Rollout + Power Automate (historial y alertas)

Corrige: R2
Esfuerzo alto

Los riesgos críticos (R2, R3) no van primero: exigen la fase de mayor esfuerzo. Empezamos por lo urgente y barato, que deja resultados visibles mientras se prepara la migración.

Un comité pequeño, medido con tres números

Comité de Arquitectura

Johanna Molina (sponsor y aprobadora), Alexander (operación), equipo de arquitectura. Reunión mensual durante el roadmap.

Dos decisiones ya registradas (ADR)

#1 Lista de SharePoint en lugar de Excel o Dataverse.
#2 BCP/DRP del servidor en lugar de migrar Anexo Unisabana.

M1 · Trazabilidad

cambios de estado con registro de auditoría

0% → 100%

al cerrar Mediano plazo

M2 · Cumplimiento

ítems del checklist del Taller 6 en Cumple

33% → 70%

al cerrar Quick win

M3 · El comité

hábiles para dictaminar una ADR o excepción

— → ≤ 10 días

desde la primera solicitud

Lo que le pedimos al comité

- Aprobar el arranque de la fase Quick win (ARCO, evaluación de WhatsApp y respaldo del rol), sin costo de licencias
- Confirmar con la Dirección de Tecnología el licenciamiento de Microsoft Purview antes de la fase Mediano plazo
- Preguntas
